



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA
 DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

Acta No° 0067/22

En la localidad de **Zapoapan de Amapan** del municipio de **Hueyapan de ocampo** siendo las **14:00** horas del día **10** del mes de **diciembre** del año **2022**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los (as) **C.P. Juan Gómez Martínez**, presidente Municipal, **C. Marcela González Urieta** Síndica, **C.P. Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el **C. Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo** director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

Los CC. _____

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), **Miguel Ángel Carrión Ángeles**; secretario (a) **C. Juan García Gutiérrez**; Vocal, **C. Anastasio Villanueva Salazar** y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022300730067** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)"**, ubicada en, coordenadas GPS: **LATITUD: 18°14'15.15"N LONGITUD: 95°11'1.82"O** de la localidad de **ZAPOAPAN DE AMAPAN**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **las 10:00 horas del día 31 de enero del 2022**.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FISM-DF/0067/2022**, teniendo un monto total de inversión de **\$ 783,682.30**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **ADJ/DIR/0065/22a** la empresa: **C. HARIM Yael Zariñana Lopez** representada por: **C. HARIM Yael Zariñana Lopez**.

Con las siguientes características de la obra:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELADO DE CAMA DE ARENA DE MEDANO DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM), DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.80 A 1.20 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 1.20 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.80 A 1.20 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 1.77 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.80 A 1.20 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Leidy

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
 H. Ayuntamiento Municipal
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 SINDICATURA
 2022 - 2025

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.80 A 1.20 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 2.55 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION."
 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO DE 0.80 MT. DE DIAMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION."
 "DESCARGAS DOMICILIARIA CORTE DE BANQUETA CON PULIDOR DE PISO ELECTRICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELADO DE CAMA DE ARENA DE MEDANO DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM), DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" x 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. "RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA" REGISTRO DE 40 X 64 X 80 CMS., MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CMS., DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KGS/CM2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO REGISTRO DE 36 X 55 X 70 CMS., MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CMS., DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KGS/CM2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 SINDICATURA
 2022-2025

H. Ayuntamiento Municipal
 Hueyapan de Ocampo, Ver.
 2022-2025


Handwritten signatures and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

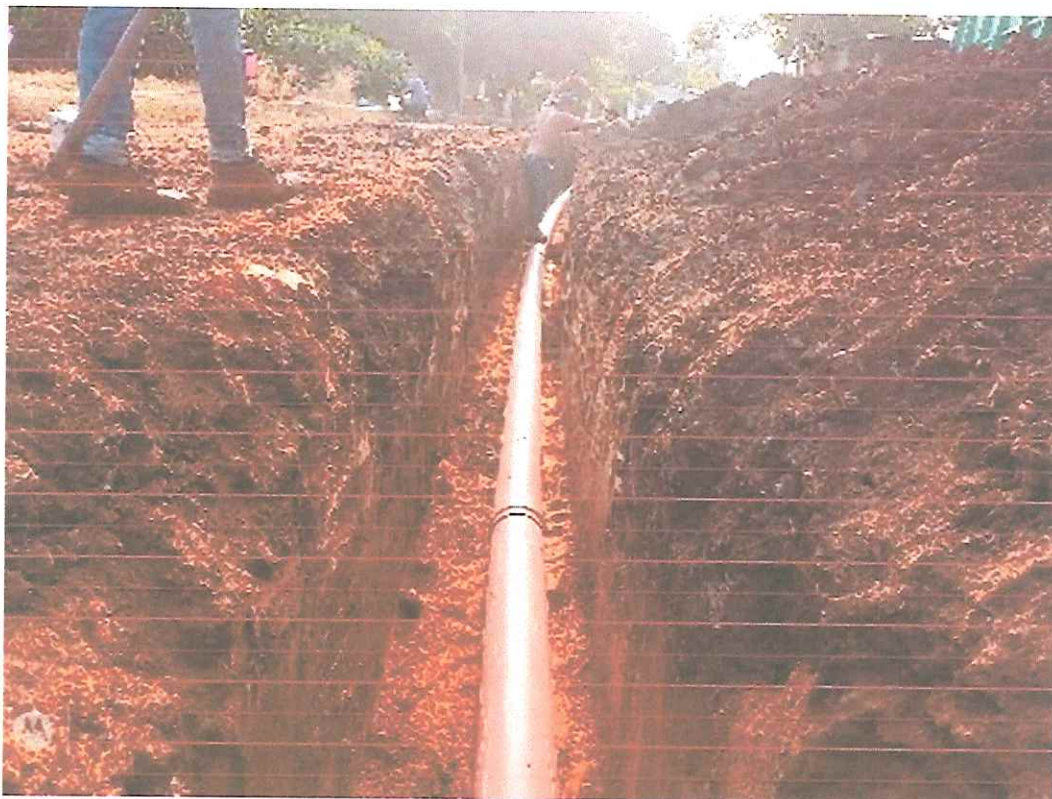

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO
SINICATURA
 2022 - 2025

H. Ayuntamiento Hueyapan de Ocampo
 Ayuntamiento Hueyapan de Ocampo
 Hueyapan de Ocampo, Oaxaca
 71100

Luciano H

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



La compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** con numero de fianza de cumplimiento. **2717377** ha garantizado al Ayuntamiento. La compañía afianzadora con numero de fianza de los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **10 de diciembre del 2022** (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervinieron en ella.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:


 C. C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
 Presidente(a) Municipal

C. Prof. Marcos Jesús Gómez ríos
 Contralor(a) Municipal

CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2022300730067 DE LA LOCALIDAD DE ZAPOPAN DE AMAPAN DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.



 Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
 Director (a) obras publicas


 C. Lázaro Pascual Martínez
 Vocal de control y vigilancia


AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



 Ing. Sara Domínguez Mariano.
 Supervisor

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.


 Miguel Ángel Carrión Ángeles.
 Presidente(a)


 C. Juan García Gutiérrez.
 Secretario(a)


 C. Anastasio Villanueva Salazar.
 Vocal


 Prof. Víctor Manuel Cobix Uzcanga
 para dar fe
 el Secretario del Ayuntamiento

