



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: DAVID TEXNA QUINO DOMICILIO: CJON. ALCALA S/N COLONIA EL MANGUITO CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95718 R. F. C.: TEQD890325266

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEIBA Y CALLE ALMENDROS"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730062	Modalidad de Contratación	
Monto del Contrato: \$ 1,269,619.99	Invitación Restringida	
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0062/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIA S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2866606	Fecha: 30/11/2023

TESORERÍA
 2023 - 2025

INVERSIÓN:

[Signature]

PRESENCIA

David T. q

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,269,619.99	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELADO DE CAMA DE ARENA DE MEDANO DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM), DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO. ACARREO EN CAMION 1er KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSA REVESTIDO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSA REVESTIDO. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTOARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 1.20 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTOARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 2,84 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS., MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CMS., DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KGS/CM2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO EN 1ER. KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSA REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



David T9





TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


David T.9

C. DAVID TEXNA QUINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.




ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

David T.9

C. DAVID TEXNA QUINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

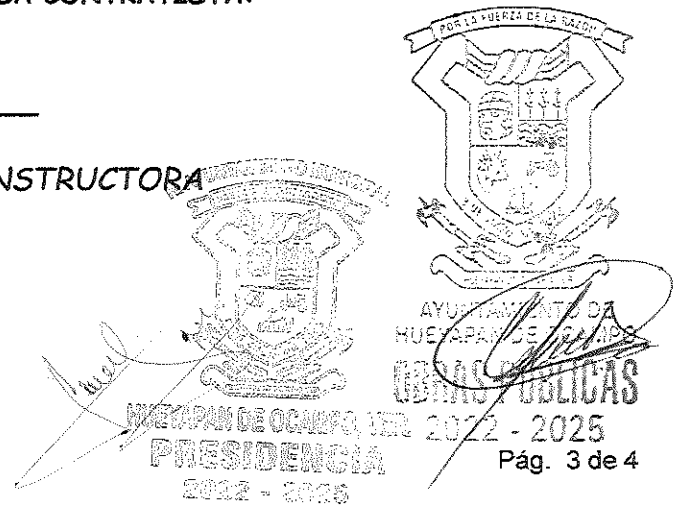



RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
PRESIDENTE MUNICIPAL
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
