



**ANEXO 12**

No. Obra: 2023300730082

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA  
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD**

En la localidad de **JUAN DIAZ COVARRUBIAS**, del municipio de **Hueyapan de Ocampo**, siendo las **17:00** horas del día **16** del mes de **octubre** del año **2023**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

**Por el ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.**

Los **C.P. Juan Gómez Martínez**, presidente Municipal, **C. Marcela Gonzalez Urieta**, Sindica, **C.P. Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el **Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo**, Director de Obras Públicas.

**Por las Autoridades de la comunidad intervienen:**

Los CC. \_\_\_\_\_

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente, **C. María Morales Cruz**; secretaria, **C. Orlando Dominguez Vazquez**; Vocal, **C. Ana Isabel Santos Hernandez** y los CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2023300730082** corresponde a la obra pública: "**REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL Y EMILIANO ZAPATA COLONIA OBRERA..**" ubicada en: **LAS COORDENADAS GPS: 18.92223° LATITUD; -95.11625° LONGITUD** en la localidad de **JUAN DIAZ COVARRUBIAS**, Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha las **11:30** horas del día **31** de enero del **2023**.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FAISMUN/0082/23**, teniendo un monto total de inversión de \$ **547,725.75.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad **ADJ/DIR/0082/23** a la empresa **HARIM Yael Zariñana Lopez** (PERSONA FISICA) representada por: **C. HARIM Yael Zariñana Lopez**.


Con las siguientes características de la obra:

DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO M3 207.44 SIMPLE DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL HUE-ACAE1 ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE M3 280.04 MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. HUE-ACAE2 ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN M3/KM 280.04 ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3 TERRACERIA HUE-EXC EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 M3 63.09 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO HUE-ACAE1 ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE M3 78.86 MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. HUE-ACAE2 ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN M3/KM 78.86 ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3 HUE-ACAB1 ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE M3 78.86 MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINA. HUE-ACAB2 ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN M3/KM 394.30 ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
HUEYAPAN DE OCAMPO VER.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2022 - 2025



TERRACERIA: EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 M3 63.09m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE M3 78.86 MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN M3/KM 78.86 ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3 ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE M3 78.86 MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINA. ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN M3/KM 394.30 ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 BASE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE M3 63.09 BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 315.44 PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 20 cm DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6/6-10. ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA ML 30.60 LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA ML 111.60 TRANVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE ML 118.32 LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL ML 127.83 CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA M2 350.00 ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.)





AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**TESORERÍA**  
2022 - 2025


*La Bx*  
  


H. Ayuntamiento Municipal  
  
Hueyapan de Ocampo, Ver.  
Secretaría  
2022-2025


Ana Isabel Santos Hedz

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. Un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

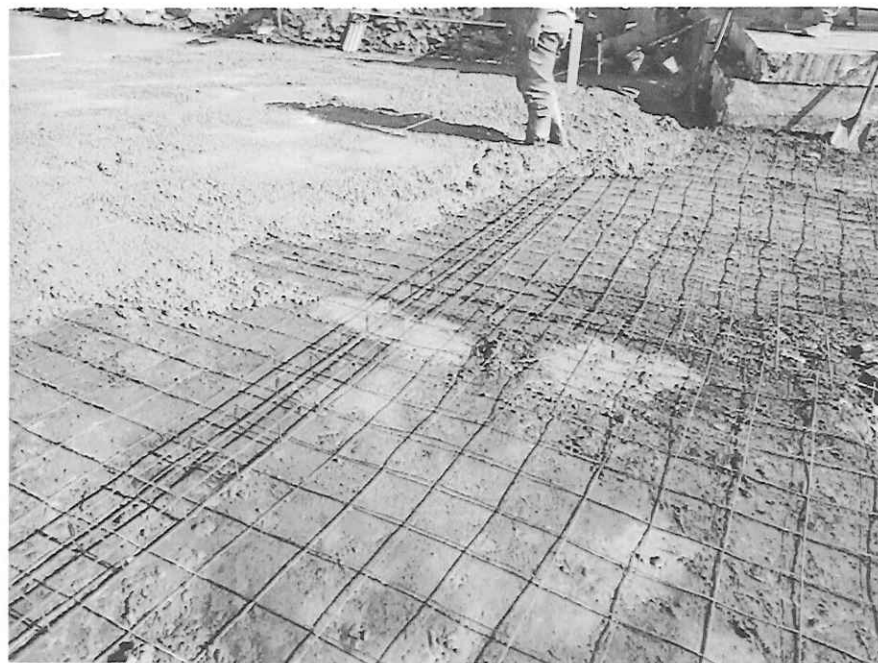

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**BRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025

HUEYAPAN DE OCAMPO  
**SINDICATURA**  
2022 - 2025

H. Ayuntamiento municipal  
Hueyapan de O. Ver.  
Secretaría  
2022-2025

*Lu B*

*h. B*


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**TESORERIA**  
2022 - 2025

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025

*Mel* *Alfonso*

Ana Isabel santos Hedz





La compañía afianzadora **Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA**, con numero de fianza de cumplimiento **4066-10767-1** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **16 DE OCTUBRE DEL 2023**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación:

**SEGUNDO.-** El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.-** El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.-** En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

*Handwritten signatures and names:*  
M...  
Ana Isabel Santos Hdz



A CONTINUACION LAS FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO. 2023300730082 DE LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.


**POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:**



**C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ**  
Presidente Municipal



**Prof. Marcos Jesús Gómez Ríos**  
Contralor Municipal



**Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo**  
Director de Obras Públicas



**C. Lazaro Pascual Martinez**  
Vocal de Control y Vigilancia



**Ing. Carlos Guzman Vazquez**  
Supervisor



**POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**



**C. Maria Morales Cruz**  
Presidente



**C. Orlando Dominguez Jasso**  
Secretario



**C. Ana Isabel Santos Hernandez**  
Vocal



**Prof. Victor Manuel Cobix Uscanga**  
Para dar fe el secretario del Ayuntamiento
