



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**HUEYAPAN DE OCAMPO**  
CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

No. Obra: 2024300730008

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA  
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD**

En la localidad de **COYOL DE GONZALEZ**, del municipio de **Hueyapan de Ocampo**, siendo las **17:00** horas del día **22** del mes de **abril** del año **2024**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:



**Por el ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.**

Los **C.P. Juan Gómez Martínez**, Presidente Municipal, **C. Marcela Gonzalez Urieta**, Sindica, **C.P. Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el **Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo**, Director de Obras Públicas.



**Por las Autoridades de la comunidad intervienen:**

Los CC. VILLENTE GONZALEZ ARIAS.  
ELPIDIO SANTIAGO RODRIGUEZ

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente, **C. Martín Pantoja Molina**; secretario, **C. Demetria Ruis Prieto**; Vocal, **C. Modesto Mateo Cruz** y los CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2024300730008** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCOS E. MORENO, ENTRE CALLES FRANCISCO GOMEZ Y LA CEIBA."** ubicada en: **LAS COORDENADAS GPS: 18°.9961"N", -95°.7186"O** en la localidad de **COYOL DE GONZALEZ**, Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha las **09:00** horas del día **27** de marzo del **2024**.



Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FAISMUN/0008/24**, teniendo un monto total de inversión de \$ **1'960,585.83**; la cual se adjudicó mediante modalidad **ADJ/REST/0008/24** a la empresa **ISAIAS ANTEMATE GOLPE (PERSONA FISICA)**, representada por: **C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE**.

Con las siguientes características de la obra:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO M2 56.72 TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-EXC EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE M3 60.50 PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. HUE-GUAR GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ML 378.13 ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HUE-RELL RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 34.03 EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO INCLUYE: VOLTEO CON PALA. HUE-PINTG SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN ML 378.13 GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. BANQUETAS HUE-TRAZ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO M2 365.57 TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 73.11 EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA INCLUYE: VOLTEO CON PALA. HUE-BAN BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 M2 365.57 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION




*[Handwritten signatures]*

**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025



PINTADO DE LOGO DE PERSONAS CON CAPACIDADES PZA 3.00 DIFERENTE DE 1.00 X 1.00 M, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE, COLOR AZUL Y BLANCO, TOMANDO EN CUENTA UN ESPESOR MINIMO DE 15 MILESIMAS DE PULGADAS DE PELICULA HUMEDA, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA NCMT -5-01-001/05. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.O.T.) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO M2 1,275.66 TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-CORT CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL M3 676.41 MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO. HUE-ACAE1 ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL M3 878.59 PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. HUE-ACAE2 ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA M3 878.59 PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. HUE-BASE SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE M3 255.13 BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MEJORAMIENTO DE CAPA CON CEMENTO (5%), MANO DE OBRA Y EQUIPO. HUE-ACAB1 ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO M3 318.91 EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. HUE-ACAB2 ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE M3 2,551.31 MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. HUE-PAV250 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 CON M2 1,275.66 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO HUE-JUN01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE ML 193.80 CONTRACION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. HUE-JUN02 CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION ML 179.83 CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO HUE-CJ01 CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON ML 977.77 DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO LIMPIEZA FINAL HUE-LIMP LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES M2 2,240.00 MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.




*Handwritten signature*

*D.R.P*

*Handwritten signature*



Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. Un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

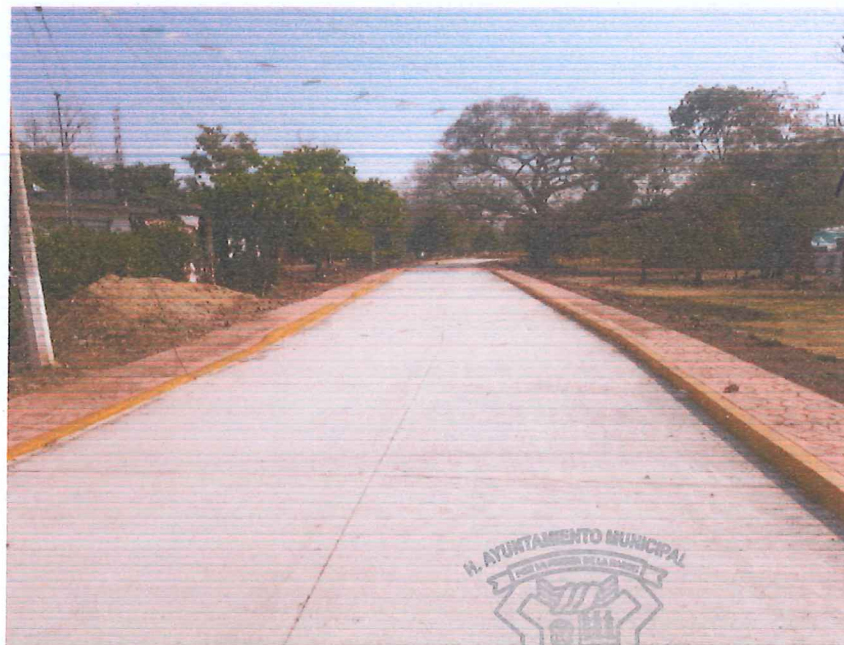


*[Handwritten signature]*  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
POR LA FUERZA DE LA LEY  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
SECRETARÍA  
2022 - 2025  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO  
SINDICATURA  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025  
*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
POR LA FUERZA DE LA LEY  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*      D.R.P      *[Handwritten signature]*



La compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, con numero de fianza de cumplimiento **2910695** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **27 DE ABRIL DEL 2024**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación:

**SEGUNDO.-**El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.-**El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.}

**CUARTO.-**En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

*Lu*

*[Signature]*



*[Signature]*

D.R.P

*[Signature]*



A CONTINUACION LAS FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO. 2024300730008 DE LA LOCALIDAD DE COYOL DE GONZALEZ, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

**POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:**




C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ  
Presidente Municipal  
2022 - 2025


Prof. Marcos Jesús Gómez Ríos  
Contralor Municipal



Carlos Daniel Cazarin Quevedo  
Director de Obras Públicas



C. Lazaro Pascual Martinez  
Vocal de Control y Vigilancia



Ing. Carlos Guzman Vazquez  
Supervisor

**POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**



C. Martin Pantoja Molina  
Presidente



D.A.P.  
C. Demetria Ruiz Prieto  
Secretaria



C. Modesto Mateo Cruz  
Vocal



Prof. Victor Manuel Cobix Uzcanga  
Para dar fe el secretario del Ayuntamiento

