

No. de Acta: HUEY/AER/0113/18


**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LOMA LARGA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO MAURICIO CADENA CASTELLANOS, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, ING. JUAN MANUEL DÍAZ CARBALLO; PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. RAMON CRUZ HERNANDEZ, C. LUIS CHAPOL MATIAS Y C. LEONARDO CALIXTO LINARES; PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO UNIDAD MEDICA"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra:	Adjudicación Directa	
2018300730113	Fecha de inicio 07/05/2018	Fecha de término 24/08/2018



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARIA
2018 - 2021

Tierra de progreso



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 121,700.93	\$ 121,700.93	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MEMORIA DESCRIPTIVA: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. SUPERFICIES MENORES DE 300 M2 . EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 60X60 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON VS# 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS REVIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.25 X 0.35 M EN CIMENTACIÓN, ARMADO CON 6 VARS DEL No 3 Y ESTRIBOS DE ACERO DEL No. 2 @10CM, T.M.A. 3/4", CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE SECCION 15 x 20 CM REFORZADA CON ARMEX DE 10x15 CM, CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CIMBRA 2 CARAS, ARMADO CON ARMEX DE 8 x15 CM, MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2,. REFORZADA CON ARMEX DE 8x15 CM, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CMS , REFORZADO CON VR DEL No 3 @ 0.40 M EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC: 200 KG/CM2 AGREGADO 3/4", PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4, ACABADO PULIDO. BASE PARA TINACO APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CMS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MCA. COMEX LINEA PRO 1000 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, PUERTA DE ALUMINIO DE 0.70 X 2.10 MTS, VENTANA DE ALUMINIO DE 0.60 X 0.40 M, CON UNA HOJA CORREDIZA.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIDADA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

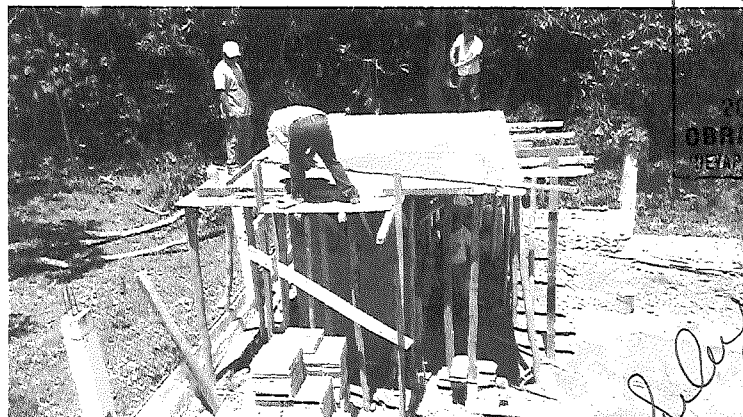

[Handwritten signature]

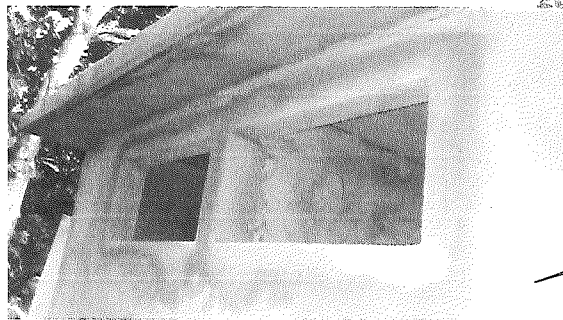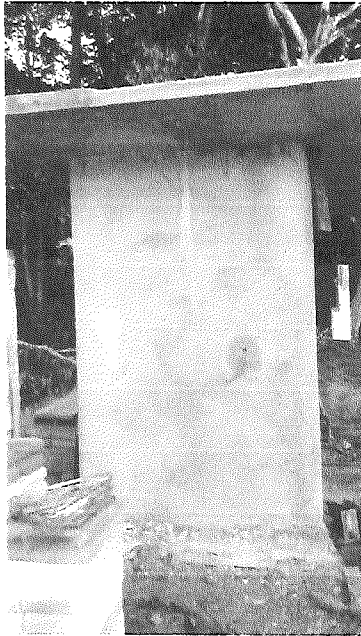


[Handwritten signature]

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN EL MISMO DIA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

ENTREGA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.:



[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

[Handwritten signature]



TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


C.P. FERNANDO MAURICIO CADENA CASTELLANOS

C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2018300730113.- MEJORAMIENTO UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LOMA LARGA.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR DEL RAMO 033



ING. RAÚL MEDINA MOYA

ING. JUAN MANUEL DÍAZ CARBALLO

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ



RECÍBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

C. RAMON CRUZ HERNANDEZ

SECRETARIO

C. LUIS CHAPOL MATIAS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO CALIXTO LINARES

PARA DAR FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. HECTOR MOLINA MARTÍNEZ

