

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JIVJ641218AG1
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEADO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION


DEL CONTRATISTA AL ENTE FISCALIZABLE

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ.
DOMICILIO: CARRANZA No. 115 COLONIA PATRIA LIBRE
CIUDAD: COSOLEACAQUE, VER. C.P 96718
R F C. JIVJ641218AG1

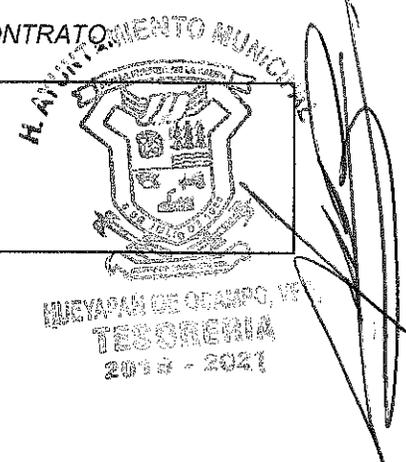

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"


DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730036	Modalidad de Contratación: INVITACION RESTRINGIDA	
Monto del Contrato: \$2'912,303.72	Fecha de inicio 01/04/2021	Fecha de término 31/03/2021
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0036/21	Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: --	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: BKY-0421-0072170	Fecha: 30/03/2021



Empresa Constructora:
C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ

Jorge Jimenez V.



COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JIVJ641218AG1
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEIO, PROMOTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2'912,303.72	\$ 2'912,303.72	0.00	0.00

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
2019 2024

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIALES, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2 , FABRICACION SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 22 TROQUELADO EN FRIJO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE INCLUYE: SELLADOR HASTA 8.00 M DE ALTURA, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO AL SITIO DE LA OBRA, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO, INCLUYE: REMATE, GRILLETE, OJO, PROTECCION ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALIBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2 , FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
2019 2024

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

[Handwritten signature]
ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL
SUPERVISOR DE OBRAS

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
[Handwritten signature]
ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, W.

Jorge Jimenez U.



COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JTVJ641218AG1
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEJO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

Jorge Jimenez V.

**C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTAS**

Jorge Jimenez V.
**C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.**

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL

