



No. de Acta: HUEY/AER/0045/21

**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL



EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ORO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, L.C. IRIS ESTRELLITA BRAVO CAJICA, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. MARIO OBIL AMBROS, C. GONZALO CHIGO DIONICIO Y C. RAYMUNDO VELASQUEZ HERNANDEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL LIC. JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"


DATOS DE LA OBRA:


Número de Obra: 2021300730045	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'104,890.90	Fecha de inicio 11/05/2021	Fecha de término 30/06/2021
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0045/21	Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S.A de C.V Grupo Financiero Asera	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 4066-07765-5	Fecha: 04/05/21
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 4066-07767-7	Fecha: 04/05/21
Empresa Constructora: C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA		

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]





INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'104,890.90	\$ 1'104,890.90	0.00	0.00








DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIALES, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2 , FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 22 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE INCLUYE: SELLADOR HASTA 8.00 M DE ALTURA, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO AL SITIO DE LA OBRA, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO, INCLUYE: REMATE, GRILLETE, OJO, PROTECCION ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PASTE NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALIBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2 , FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

Handwritten notes:
Jul
P
MARTIN
e



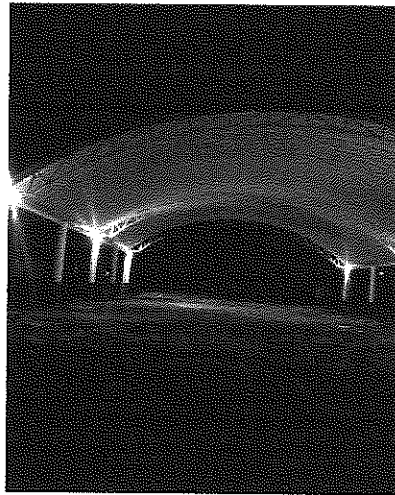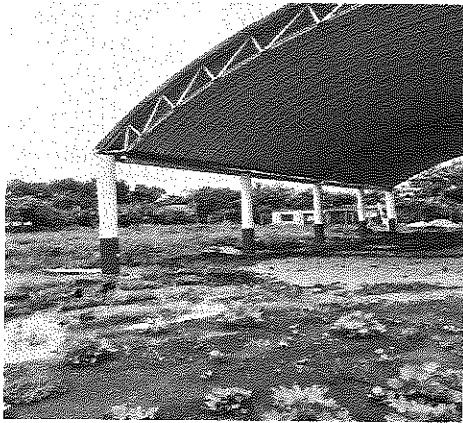

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CDM

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C.C IRIS ESTRELLITA BRAVO CAJICA


HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2018 - 2021



CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2021300730045.-
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE ORO, DEL H.
AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA




ING. RAÚL MEDINA MOYA


C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE OBRAS


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

RECÍBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

SECRETARIO


C. MARIO OBIL AMBROS


C. GONZALO CHIGO DIONICIO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


C. RAYMUNDO VELASQUEZ HERNANDEZ

PARA DAR FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL


LIC. JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ

SECRETARIA
2018 - 2021

