



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA
 DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

Acta No° 0085/22

En la localidad de Hueyapan de Ocampo del municipio de Hueyapan de Ocampo siendo las 17:00 horas del día 10 del mes de diciembre del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los (as) C.P. Juan Gómez Martínez, presidente Municipal, C. Marcela González Urieta Síndica, C. Valentín Fernández Prieto, Tesorero Municipal y el C. Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo director de Obras Públicas.



Por las Autoridades de la comunidad intervienen:
 Los CC. _____

H. Ayuntamiento municipal

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente, Ariana Zamora Domínguez; secretario, C. Jorge Alberto Zamora González; Vocal, C. Vianey Domínguez Vale. y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.




El referido Comité número 2022300730085 corresponde a la obra pública: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO" ubicada en: COORDENADAS GPS; LATITUD: 18° 9' 11.44" N LONGITUD: 95° 8' 22.96" O de la colonia CENTRO de la localidad HUEYAPAN DE OCAMPO autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha las 10:00 horas del día 31 de enero del 2022.

LRH

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: HUEY/FISMDF/0085/22, teniendo un monto total de inversión de \$ 1,000,914.21; la cual se adjudicó mediante modalidad: ADJ/DIR/0086/22 a la empresa: C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE, representada por: C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE.

Con las siguientes características de la obra:



Ariana Z.D

J.P.

Vianey Domínguez





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO FN CFPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. FN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINIDAD DE TALUDS Y FONDO GUARNICION DE CONCRFTO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION "BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL , AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)." SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TERRACERIA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ESCARIFICADO DE CAPA BASE EXISTENTE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3 ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINA. ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



H. Ayuntamiento municipal



capturada en moto g+ plus
 Jorge Luis as

24 de noviembre de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PUBLICAS

Ariana Z. D

Jorge

Viviany Dominguez Valle

2022 - 2025
 Página 2 de 5



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



H. Ayuntamiento municipal




Hueyapan de O. Ver
 Secretaría
 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



Lucas H



OBRAS PUBLICAS



Ariana Z.O

Judy

Vianey Dominguez Vall



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025

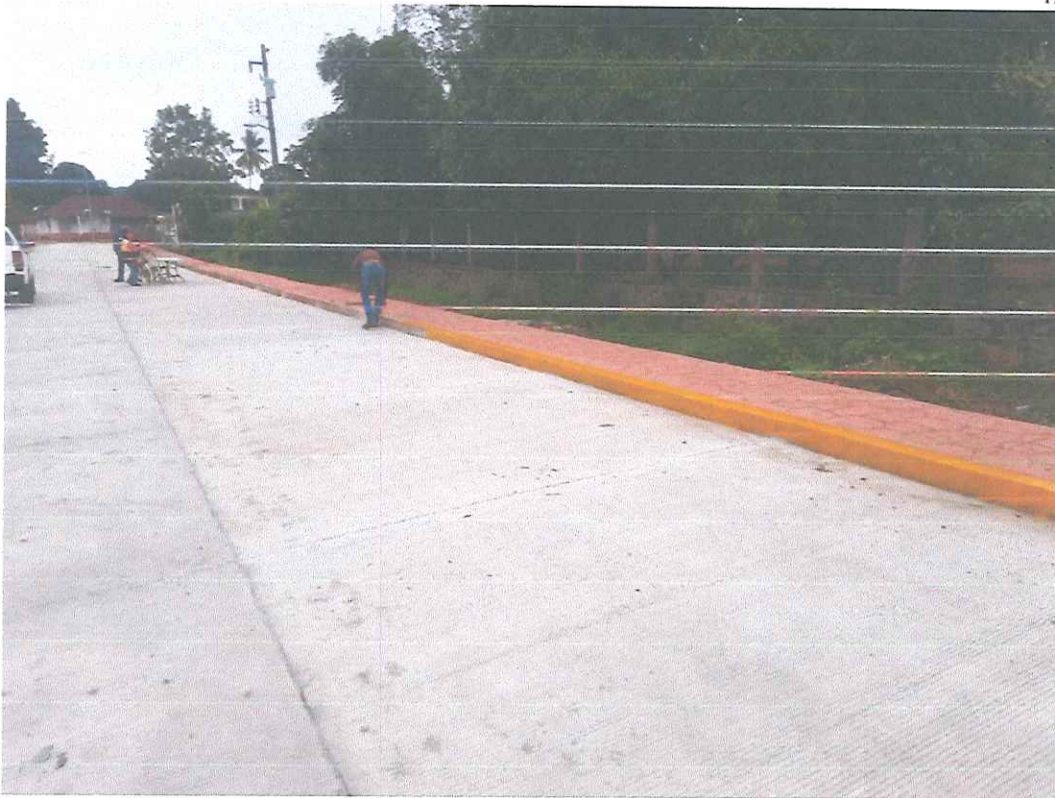

La compañía afianzadora **Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA**, con numero de fianza de cumplimiento. **10019-08933-6** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **21 DE OCTUBRE DEL 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

LBH

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella



Ariana z. D

Judy

Vianey Dominguez Valle





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

[Handwritten signature]
 C. C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
 Presidente(a) Municipal



[Handwritten signature]
 C. Prof. Marcos Jesús Gómez ríos
 Secretario(a) Municipal



CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2022300730085 DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

[Handwritten signature]
 Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo
 Director (a) obras publicas

[Handwritten signature]
 C. Lázaro Pascual Martínez
 Vocal de control y vigilancia



[Handwritten signature]
 Ing. Carlos Guzmán Vázquez.
 Supervisor

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

[Handwritten signature]
 Ariana Z.O
 Presidente(a)
 C. Ariana Zamora Domínguez.

[Handwritten signature]
 Secretaria
 C. Jorge Alberto Zamora González.

[Handwritten signature]
 Vocal
 C. Vianey Domínguez Vale.

[Handwritten signature]
 Prof. Víctor Manuel Cobix Uzcanga
 para dar fe el secretario del Ayuntamiento

