

No. de Acta: HUEY/AER/0008/18


**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO MAURICIO CADENA CASTELLANOS, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, ING. JUAN MANUEL DÍAZ CARBALLO; PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. ALBERTO MAULEON FERNANDEZ, C. JOSE FRANCISCO RIVADENEYRA HERNANDEZ Y C. ROSA BROCA ROMAN; PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra:	Adjudicación Directa	
2018300730008	Fecha de inicio 07/05/2018	Fecha de término 24/08/2018



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

Jorge Alberto Quinto Zamorano
Pág. 1 de 4
Tierra de progreso

R.B. Mh

Hector Molina Martínez

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
2018 - 2021

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 150,150.43	\$ 150,150.43	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MEMORIA DESCRIPTIVA:



DESAMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTES SIN RECUPERAR MATERIAL, ENRACE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10x20x40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:4, CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CIMBRA 2 CARAS, ARMADO CON ARMEX DE 8 x15 CM, MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10x20x40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:4, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CMS. BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26. PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4, ACABADO PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETA DE CERAMICA A HUESO ASENTADA CON CEMENTO CREST O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN MUROS COLOCADA A HUESO ASENTADA CON CEMENTO CREST O SIMILAR. CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON ELECTROMALLA #6, DE 07 CM. DE ESPESOR. CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, FOSA SEPTICA SE 2.00x2.00 M POR 2.00 M DE PROFUNDIDAD

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

H. AYUNTAMIENTO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARÍA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERÍA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

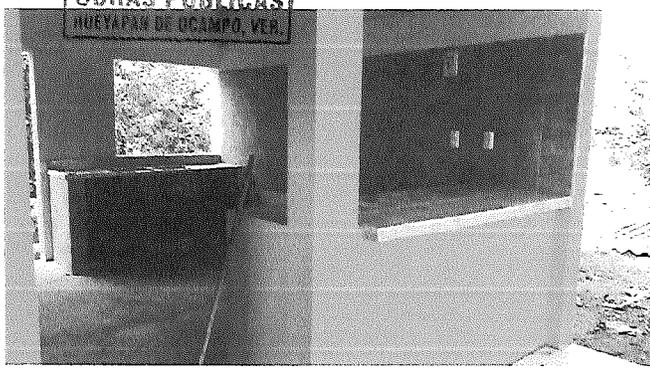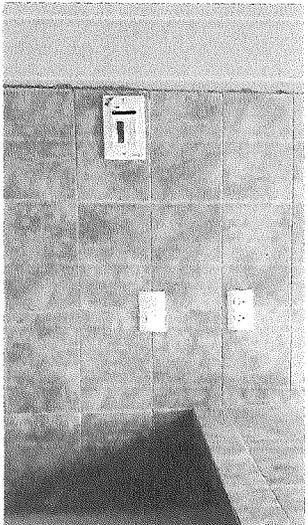



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO MAURICIO CADENA CASTELLANOS



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2018300730008.- MEJORAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPAN.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR DEL RAMO 033



ING. RAÚL MEDINA MOYA

ING. JUAN MANUEL DÍAZ CARBALLO

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ

RECÍBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. ALBERTO MAULEON FERNANDEZ

C. JOSE FRANCISCO RIVADENEYRA HERNANDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. ROSA BROCA ROMAN

PARA DAR FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. HECTOR MOLINA MARTÍNEZ



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARIA
2018 - 2021
