

No. de Acta: HUEY/AER/0041/18

**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

**DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021**

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO MAURICIO CADENA CASTELLANOS, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, ING. JUAN MANUEL DÍAZ CARBALLO; PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. MARIA EUGENIA NAVARRETE MATHEY, C. IRENE FREYRE NOLASCO Y C. JOSÉ ROBERTO COBIX RIOS; PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra:	Adjudicación Directa	
2018300730041	Fecha de inicio 21/05/2018	Fecha de término 09/07/2018



Handwritten signatures and names: Irene F.N., Mar. Eugenia Navarrete M.

Handwritten signatures and text: Tierra de progreso

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 113,515.74	\$ 113,515.74	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 Irene F.N.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MEMORIA DESCRIPTIVA: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 60X60 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON VS# 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS REVIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 M EN CIMENTACIÓN, ARMADO CON 6 VARS DEL No 3 Y ESTRIBOS DE ACERO DEL No. 2 @10CM, T.M.A. 3/4", CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE SECCION 20 x 25 CM REFORZADA CON ARMEX DE 10x15 CM, CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CIMBRA 2 CARAS ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX DE 10 x 10 CM, MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2,. REFORZADA CON ARMEX DE 8x15 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS MCA. COMEX LINEA REALFLEX

Ma. Eugenia Navarro M.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
 2018 - 2021

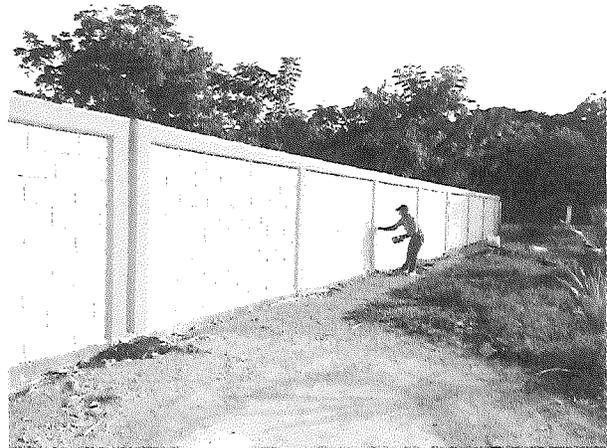
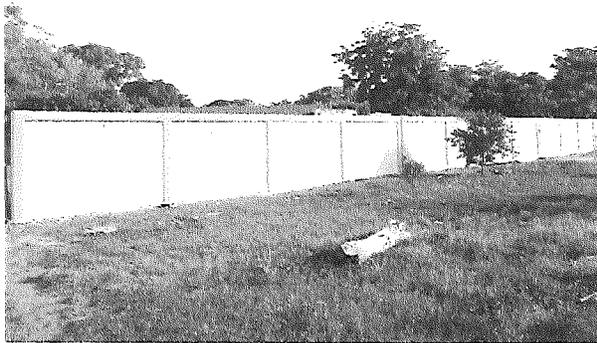
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(Handwritten signature)

Irene F.N.

Ma. Eugenia Navarrete M.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.:



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

C.P. FERNANDO MAURICIO CADENA CASTELLANOS



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

(Handwritten signature)



CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2018300730041.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR DEL RAMO 033




ING. RAÚL MEDINA MOYA


ING. JUAN MANUEL DÍAZ CARBALLO



SUPERVISOR DE OBRAS



ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ

RECÍBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

SECRETARIO


C. MARIA EUGENIA NAVARRETE MATHEY


C. IRENE FREYRE NOLASCO



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


C. JOSÉ ROBERTO COBIX RIOS

PARA DAR FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ

