

No. de Acta: HUEY/ AER/0210/19

**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
PERIODO 2018 - 2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL ARQ. ANDRES IBARRA CISNEROS SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. RAUL CASTILLO ROMAN, C. HECTOR OCTAVIO GUERRERO RUIZ Y C. MA. DEL CARMEN RAMIREZ RODRIGUEZ, SECRETARIO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:


"REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL"

**DATOS DE LA OBRA:**

Número de Obra:  2019300730210	Adjudicación Directa	
	Fecha de inicio 13/05/19	Fecha de término 10/08/19



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**TESORERIA**  
2018 - 2021



Pág. 1 de 4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**CONTRALORIA**  
2018 - 2021

*MA del C. Ramirez R.*

*Raúl Castillo R.*

*Fuerza de progreso*



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 346,896.56	\$ 346,896.56	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

PRELIMINARES: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUELTAS Y LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, SE DEBERA REVISAR LA SUPERFICIE PARA UBICAR Y PROCEDER A RETIRAR TODAS LAS PARTES DANADAS, DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXION DEL MUEBLE, DESMONTAJE DE W.C. DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXION DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESMONTAJE DE CANCELARIA METALICA SIN RECUPERACION, DESMONTAJE DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y LAMINA DE 1.00 X 2.10 M. SIN RECUPERACION, DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA O PINTADA SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10M, DEMOLICION A MANO DE CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO HASTA 15X20 CM DE SECCION, DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ALBAÑILERIA: CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLO DE SECCION 10 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NUMERO 2 A CADA 20 CM, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 10 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10 X 20 = 4, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 - 6 / 10 - 10, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", EMBOQUILADO APLANADO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADOS: AFINE DE MUROS Y PLAFONES CON REDYMET PARA DAR ACABADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE PISO INTERCERAMIC DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTECA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LITROS COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR, HERRERIA Y CANCELERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, TIPO COMERCIAL DE 2" LINEA CORREDIZA GUILLOTINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, TIPO COMERCIAL DE 2" FABRICADA CON PERFILES Y DUELAS DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, TIPO COMERCIAL DE 2" FABRICADA CON PERFILES Y DUELAS DE ALUMINIO, REHABILITACION DE PUERTAS Y/O VENTANAS DE PERFIL TUBULAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA, FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LAMINA CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERREERIA, FABRICADA CON CUADRADO DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLON CALIBRE 11, ABERTURA DE 55 X 55, DE 6.00 X 2.20 M. DE ALTURA, TECHADO: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 32, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. EN ALIMENTACIONES. SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 4" Y 2", SUMINISTRO, ELEVACION Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: LUMINARIA INCANDESCENTE, CAJA DE 3X3, POLIDUCTO DE 3/4", CABLE THW CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALIBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO.


Ramirez R.  
M. del C.  
Raul Castillo R.




UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**TESORERIA**

*[Handwritten signature]*



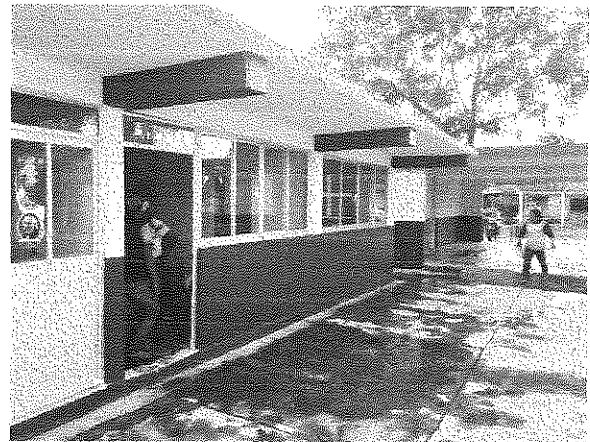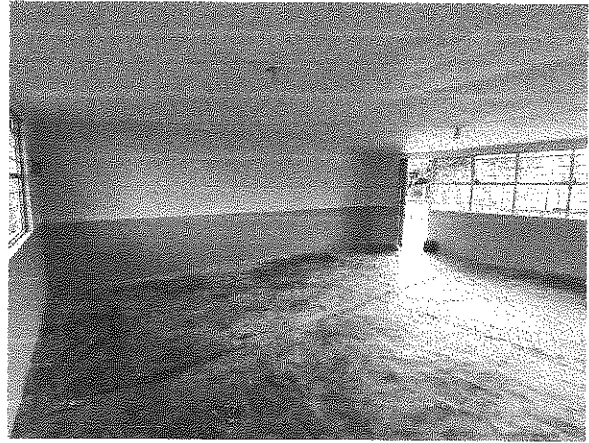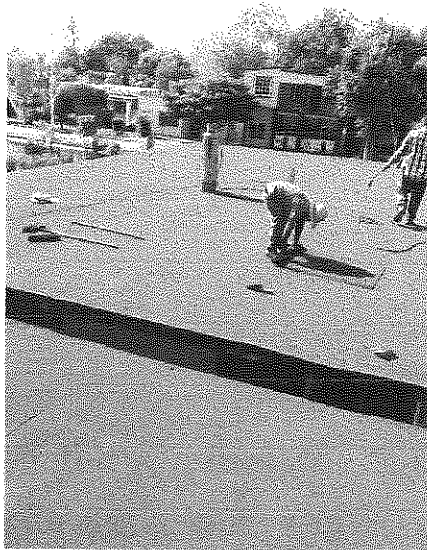

*Rad Castillo R. M<sup>a</sup> del C. Ramirez. R.*

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

### ENTREGA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERÍA  
2018 - 2021

CONTROLADOR MUNICIPAL


C.P. JOSÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ


HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
CONTROLADORÍA  
2018 - 2021



CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2019300730210.- REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAÚL MÉDINA MOYA



SUPERVISOR DE OBRAS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS

RECIBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
C. RAUL CASTILLO ROMAN


SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
HECTOR OCTAVIO GUERRERO RUIZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
\_\_\_\_\_  
C. MA. DEL CARMEN RAMIREZ RODRIGUEZ

PARA DAR FE  
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
DR. HÉCTOR MOLINA MARTINEZ

