



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
CONTRALORIA  
2018 - 2021



No. de Acta: HUEY/ AER/0010/20

**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
PERIODO 2018 - 2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HERMOSA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 JULIO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCON HERNANDEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. DOMINGO RAMIREZ PASCUAL, NICOLAS RAMIREZ FELIPE. Y C. ROSALBA PASCUAL SANTOS.; PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLES"

**DATOS DE LA OBRA:**

Número de Obra: 2020300730010	Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA	
Monto del Contrato: \$ 85,075.84	Fecha de inicio 10/06/2020	Fecha de término 03/07/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0010/20	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.V. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: No se otorga	Fecha: ---
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3917-03494-0	Fecha: 09/06/2020
Empresa Constructora: LEIDY DIANA SEBA JEREZANO		

*Domingo*

e

*Tierra de progreso*



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 85,075.84	\$ 85,075.84	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

Trazo y nivelación de terreno por medios manuales, estableciendo ejes y referencias en área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Excavación a mano en zanjas, en material "B" en seco, hasta 1.50 m de profundidad, incluye: afine de talud, fondo, acarreo dentro y fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. plantilla apisonada manualmente en zanjas, con material de banco, para dar apoyo uniforme a tubería, incluye: acarreo y humedad óptima, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Relleno en zanjas con material producto de banco, compactado manualmente en capas de 20 cm espesor promedio, incluye: acarreo y Humedad óptima, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Relleno en zanjas con material producto de la excavación, compactado manualmente en capas de 20 cm espesor promedio, incluye: acarreo y humedad óptima, y todo lo necesario para su correcta ejecución. acarreo en camión 1 er km, de material mixto en camino lomerío suave breca, terracería pronunciada, montañoso revestido, incluye carga manual. suministro y colocación de tubería de pvc hidráulico RD-26 con campana de 50 mm (2") de diámetro, incluye: maniobras, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. suministro y colocación de codo de 2" de diámetro x 90° de pvc hidráulico suministro y colocación de cople de reparación de 2" de diámetro de pvc rd-26 hidráulico. Suministro y colocación de adaptador campana de pvc hidráulico 50 mm, incluye: acarreo, limpieza y conexión a tubería o válvula, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de adaptador espiga de pvc hidráulico mm, incluye: acarreo, limpieza y conexión a tubería o válvula, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de válvula Compuerta 2" de diámetro incluye: acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de válvula de expulsión de aire de 2" de diámetro incluye: acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Caja para operación de válvulas

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

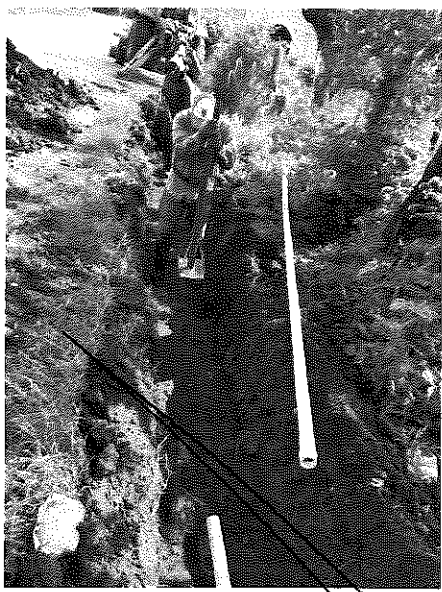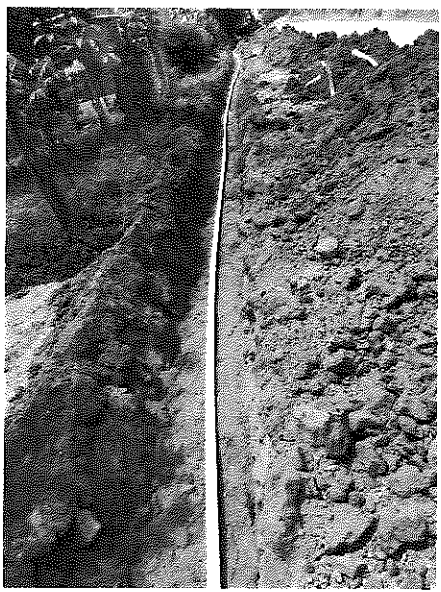

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2020300730010.- DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HERMOSA, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAÚL MEDINA MOYA

  
\_\_\_\_\_  
C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE OBRAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

**RECÍBE**

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
C. DOMINGO RAMÍREZ PASCUAL

  
\_\_\_\_\_  
C. NICOLAS RAMIREZ FELIPE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
\_\_\_\_\_  
C. ROSALBA PASCUAL SANTOS

PARA DAR FE  
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TAPAPAN DE OCAMPO, VER.  
SECRETARIA  
2018 - 2021

