

No. de Acta: HUEY/AER/0035/20

RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL


EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), LA ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. GILBERTO CAYETANO URIETA, C. NAYELI DEL CARMEN CAYETANO JIMENEZ Y C. RIGOBERTO CAYETANO URIETA, PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HÉCTOR MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

DATOS DE LA OBRA:

Table with 3 columns: Data, Modalidad de Contratación, Fecha de inicio, Fecha de término, etc. Includes fields for Número de Obra, Monto del Contrato, No. Contrato, Fianza de Anticipo, Fianza por cumplimiento, and Empresa Constructora.





**INVERSIÓN:**

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,196,999.89	\$ 1,196,999.89	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PÍLIDO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DUPLEX, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





3

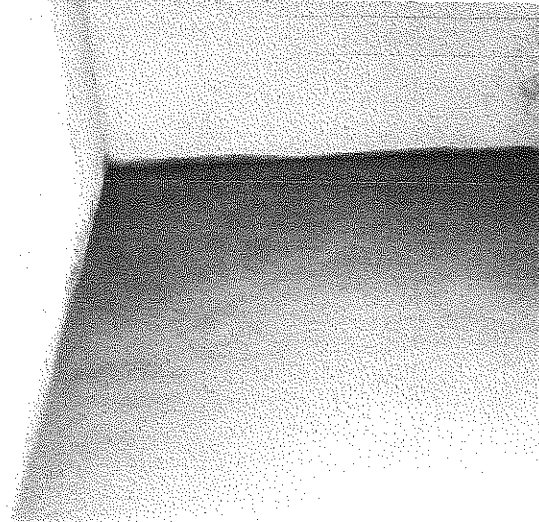

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2020300730035.-  
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE  
JUAN DIAZ COVARRUBIAS, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

**RECÍBE**

**POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:**

PRESIDENTE

SECRETARIO

  
C. GILBERTO CAYETANO URIETA

  
C. NAYELI DEL CARMEN CAYETANO JIMENEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
C. RIGOBERTO CAYETANO URIETA

PARA DAR FE  
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

  
DR. HECTOR MOLINA MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
SECRETARIA  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
NUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
2018 2021  
OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPAL DE OCAMPO, VER.
